

POZNÁMKA K PROVEDENÍ DIO:

- Zhotovitel stavebních prací zajistí bezpečný průchod pěších v šíři min. 1,5 m v koridorech pro pěší.
- Přístup k nemovitostem v úseku stavby bude po celou dobu realizace stavebních prací umožněn.
- Provizorní přemostění výkopů bude v šíři min. 1,2 m.
- Výkopy a staveniště budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob do prostoru staveniště.




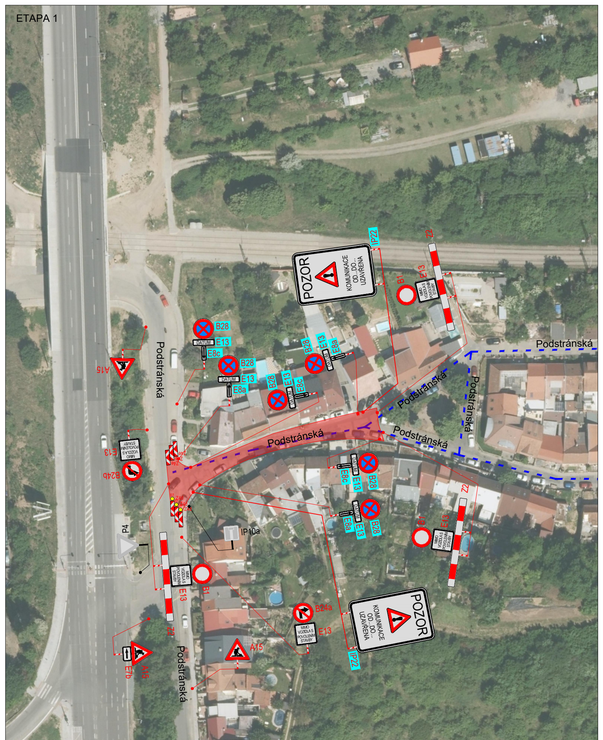

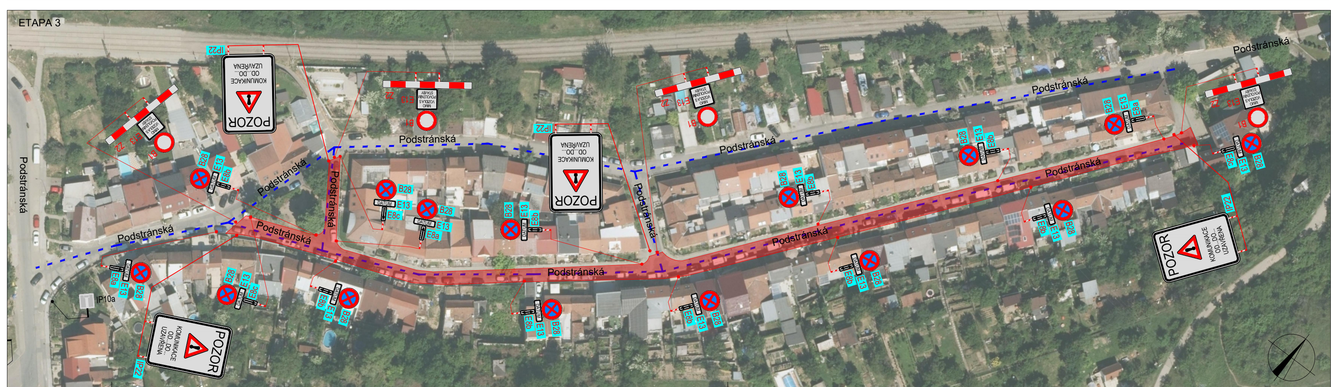

SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU	SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU	SOUHLASÍME S PDZ a UZAVÍRKOU
V ..... dne	V ..... dne	V ..... dne .....

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



LEGENDA

- P6 — TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P6 — DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STOP P6 — NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- UZAVÍRKA KOMUNIKACE
- TRASA VODOVODU
- POZOR KOMUNIKACE OD..DO.. UZAVÍRKA P22 — NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, OSAZENO 7 DNÍ PŘED UZAVÍRKOU

Č. J.: MMB/0584508/2026/MAI
SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0575317/2026/2

Použité dopravní značení bude v základní velikosti a v reflexním provedení tř 1
K návrhu dopravního značení bylo využito TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II vydání

VYPRACOVAL: Lada Šťastná	DoZBos s.r.o. Průmyslová 2641/12 680 01 Boskovice E-mail: dozbos@dozbos.cz www.dozbos.cz
KONTROLOVAL: Ing. Mgr. Josef Janík	
NÁZEV AKCE: BRNO, PODSTRÁNSKÁ I - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU	DATUM: 8/2024
	FORMÁT: 4xA4
NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: .....
OBSAH:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 1.1
