Schéma 1

zábor vozovky bude
osazen pouze v pracovní dobu
a po dobu nezbytně nutnou

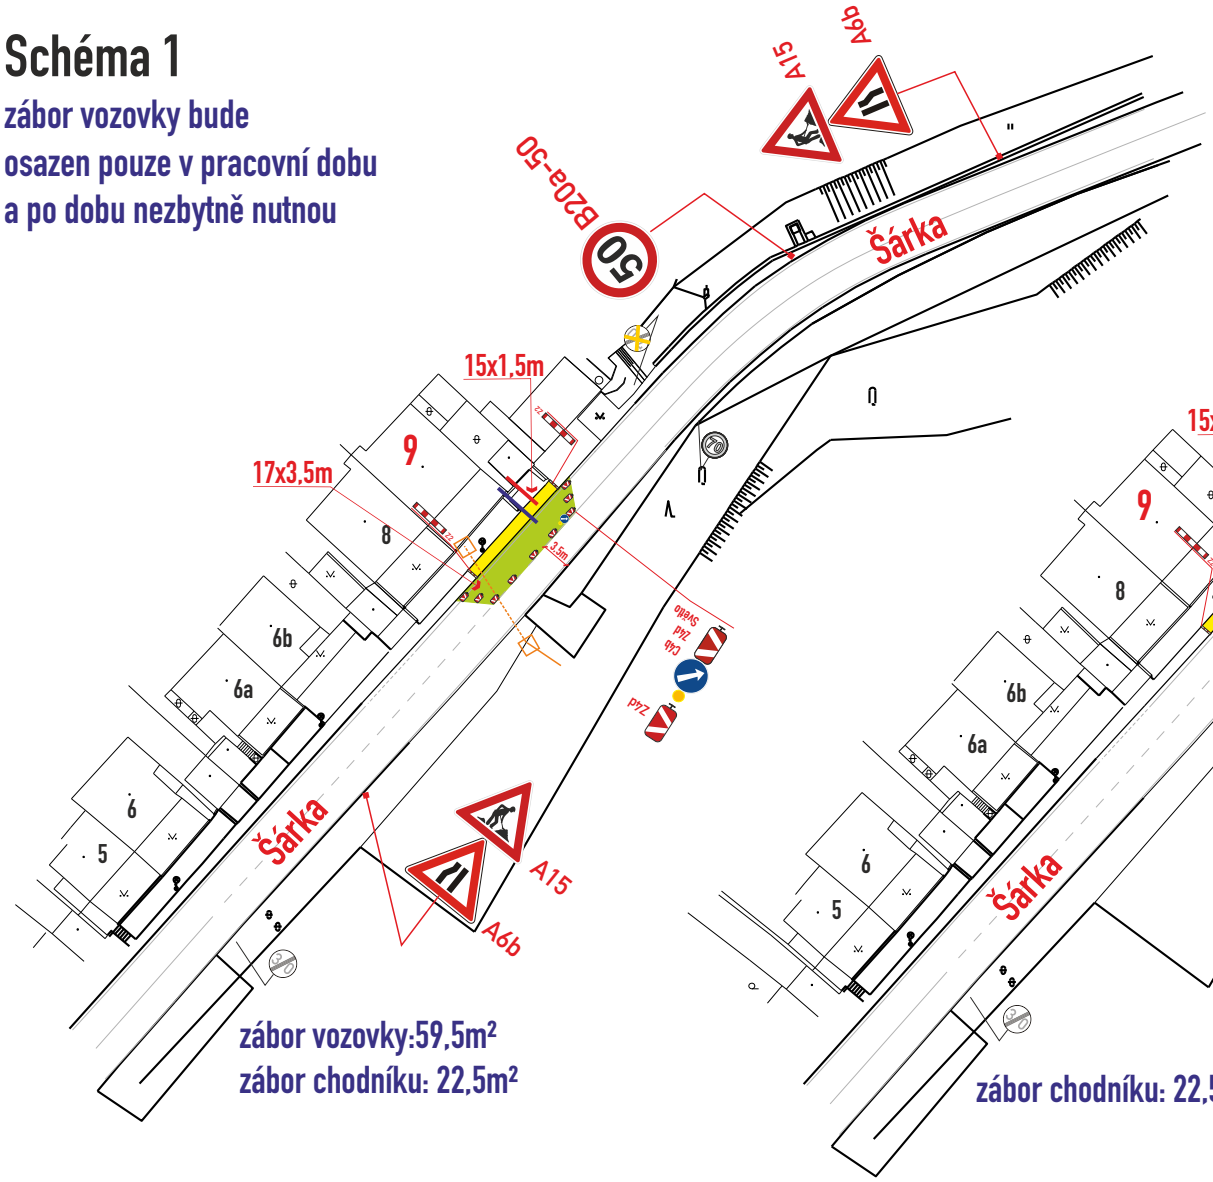

zábor vozovky:59,5m²
zábor chodníku: 22,5m²

Schéma 2

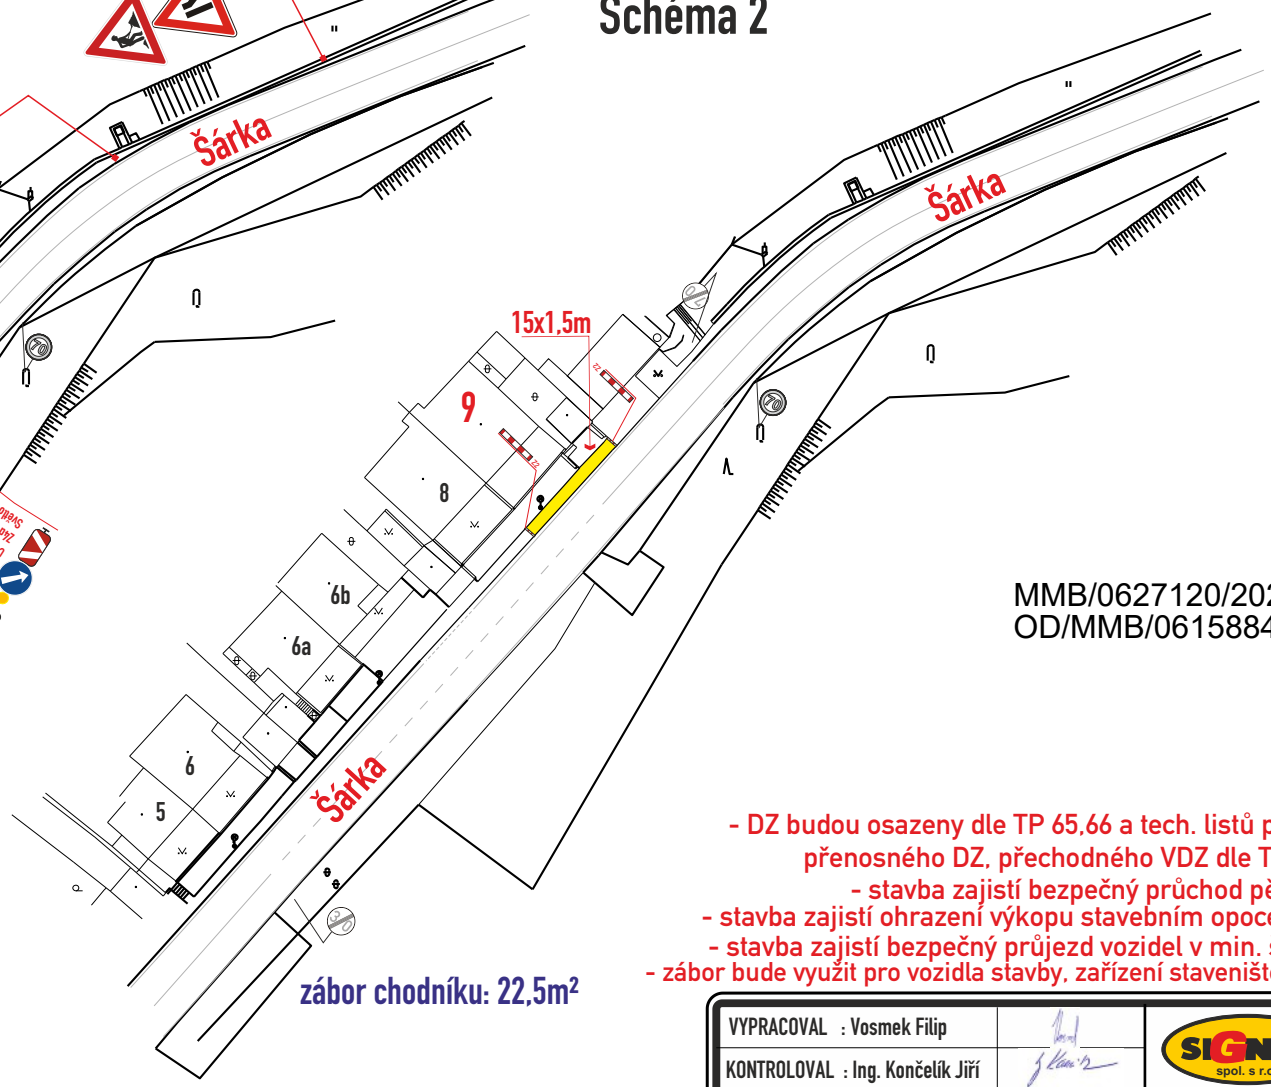

zábor chodníku: 22,5m²

MMB/0627120/2026
OD/MMB/0615884/2026/2

- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66
- stavba zajistí bezpečný průchod pěších stavbou
- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo Z2
- stavba zajistí bezpečný průjezd vozidel v min. š. 3m (2,75m)
- zábor bude využit pro vozidla stavby, zařízení staveniště a kontejnery

Legenda zařízení stavby, obj. trasy, výkopy :

vodovod :
srážková kanalizace :
splašková kanalizace :
protla :
jáma protlaku :

Legenda značení ve schématu /barva popisu :

přenosné SDZ : A15
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
zábor vozovky :
zábor chodníku :

VYPRACOVAL : Vosmek Filip	SIGNEX spol. s r.o.
KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří	
obsah schématu : PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ zábor vozovky a chodníku	**kontakt :** SIGNEX, spol. s r.o., Holzova,138, 627 00 Brno Tel.: 545 226 021-4 , mistr: tel.: 602 58 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312 email: signex@signex.cz
místo akce/název : BRNO, ul. Šárka 9 novostavba BD	**číslo objednávky / datum :** 250841 11.11.2025 **strana :** 1
